# SARPI Remediation NV

# $CO_2$- Prestatieladder Projectportfolio

**Project :** SP24.057 - OVAM Sint Pieters Leeuw
**Opdrachtgever :** Ovam
**Datum :** 30 september 2024

| | | |
|---|---|---|
| Opgesteld door : | Frederic Faes<br>Project Leader | Handtekening:<br>✍ |
| Goedgekeurd door : | Erik Sweevers<br>QIRE Manager | Handtekening:<br>✍ |

## 1. Inleiding en verantwoording

SARPI Remediation NV heeft op 5 augustus 2024 van Ovam de opdracht gekregen voor het uitvoeren van de sanering van SP24.057 - Ovam Sint Pieters Leeuw. SARPI heeft zich voor dit project ingeschreven met $CO_2$-ambitieniveau 3. Het $CO_2$-ambitieniveau heeft geleid tot een gunningsvoordeel.

Voor elk van de projecten met gunningvoordeel eist de $CO_2$-Prestatieladder dat bepaalde aspecten van de doorvertaling van de bedrijfsaanpak naar het projectniveau daadwerkelijk worden aangetoond met documentatie. Hoe de administratieve bewijsvoering wordt ingericht, beslist het bedrijf zelf. In deze portfolio is deze doorvertaling gemaakt. Allereerst worden de te verwachten energiestromen en energieverbruikers in kaart gebracht. Vervolgens worden de grenzen van het project afgebakend en worden de energieverbruikers ingedeeld in scope 1,2 en 3.

Op basis van de calculatie wordt er een verwachte $CO_2$-uitstoot berekend. Dit is zonder dat er bijzondere maatregelen genomen worden. Vervolgens worden er maatregelen gedefinieerd om de $CO_2$-uitstoot voor het project te verminderen.

Uiteindelijk wordt er een $CO_2$-footprint van het werkelijk verbruik opgesteld. Aan de hand van deze footprint wordt nagegaan of de vooropgestelde reductie gehaald werd, en kunnen eventueel corrigerende maatregelen worden genomen.

SARPI Remediation streeft naar transparantie. Daarom zal deze portfolio en andere informatie met betrekking tot de $CO_2$-uitstoot openlijk worden gecommuniceerd, o.a. via de website.

## 1.1. Beschrijving project

Het project betreft het ontgraven van asbesthoudende grond met puin tot een diepte van 0.5m in een weide van een manege. Na de sanering zal deze terug gebruikt worden als weide.

## 1.2. Omschrijving van werkzaamheden

De werkzaamheden op het project Ovam St Pieters Leeuw bestaan o.a. uit:

- Inrichten werf zone
- verwijderen van bomen
- ontgraven van de verontreinigde zone
- afvoer van de ontgraven grond naar Grimbergen
- verwerken van de verontreinigde grond
- plaatsen van een geotextiel

# 2. Inzicht

Om inzicht te krijgen in de omvang van de $CO_2$-emissie die wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten van SARPI tijdens het project, zijn de te verwachten energiestromen geïnventariseerd.

## 2.1. Bepalen energiestromen en energiegebruikers

Onder energiestromen wordt voor dit project gekeken naar: brandstoffen en elektriciteit.

Brandstoffen zullen worden verbruikt voor o.a. machines en eventueel overig klein materieel. Elektriciteit zal worden verbruikt voor o.a. de bemaling, de waterzuivering, en de werfkeet.

## 2.2. Verantwoordelijke rapportage

De directie van SARPI Remediation is eindverantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de $CO_2$-uitstoot en de registratie hiervan. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor registratie is in handen van de projectleider.

## 2.3. Organisatorische grens

Dit project wordt uitgevoerd door SARPI Remediation. Er wordt gebruikgemaakt van onderaannemers (civiele werken, transport, grondreiniging). De organisatorische grens (niv 3) wordt beperkt tot de activiteiten op de projectlocatie.

## 2.4. Scope 1 emissies

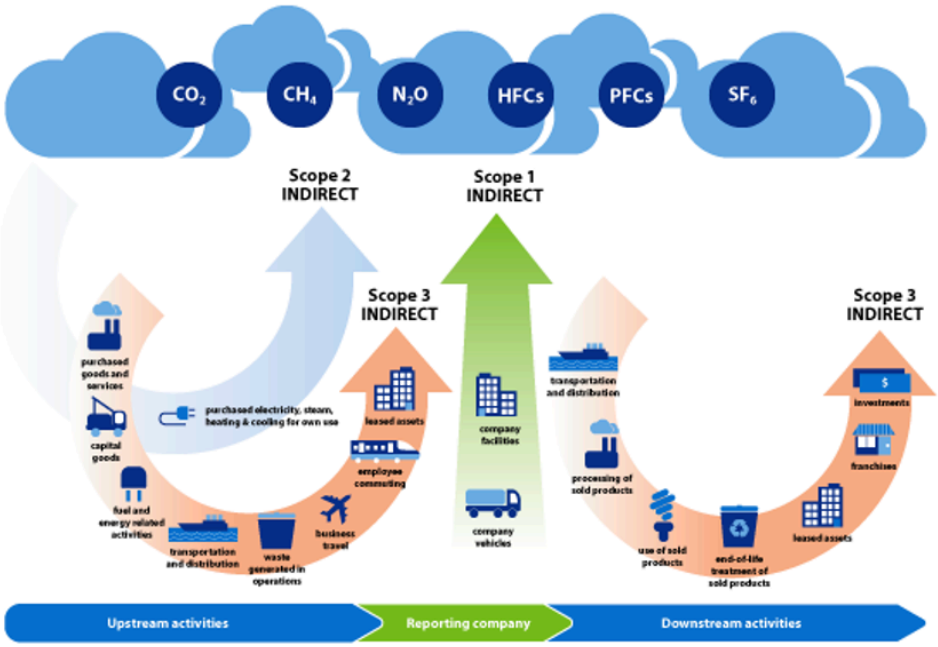


Scope 1 emissies, of directe, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van, of gecontroleerd worden door, SARPI Remediation. In het kader van dit project zijn dit het verbruik van brandstoffen door de stroomgroep, de machines, en door klein materieel.

## 2.5. Scope 2 emissies

Scope 2 emissies, of indirecte, zijn emissies die ontstaan door opwekking van elektriciteit in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales. In het kader van een project is het verbruik van elektriciteit voor o.a. de waterzuiveringsinstallatie en de werfkeet die in scope 2 valt.

## 2.6. Scope 3 emissies

Scope 3 emissies, of overige, zijn emissies die ontstaan als gevolg van activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn, noch beheerd worden door het bedrijf. In het kader van een project zijn de emissies die voorkomen uit het uitbestede transport van de grond ingedeeld in scope 3. Scope 3 emissies worden niet meegenomen in de footprint bij ambitieniveau 3.

## 2.7. Verbranding Biomassa en verwijdering GHG

Binnen dit project van SARPI Remediation wordt geen biomassa verbrand en vindt geen verwijdering van GHG door middel van binding van $CO_2$ plaats.

## 2.8. Onderbouwing uitsluitingen

Tijdens het project vindt er samenwerking plaats met diverse partijen (aannemers, onderaannemers, EBSD). Omdat de invloed van SARPI Remediation op de uitstoot van anderen beperkt is, zullen deze niet worden meegewogen.

## 2.9. Meetmethoden

Tijdens het project vindt met name uitstoot plaats als gevolg van verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit. Het verbruik van de verschillende energiestromen is bepaald op basis van de inkoopfacturen.

## 2.10. Onzekerheden

### 2.10.1. Brandstof machines:

De hoeveelheid brandstof is bepaald op basis van de aankoopfacturen. Hierdoor is het aantal ingekochte liters goed gekend, er zit weinig onzekerheid op.

### 2.10.2. Brandstof wagenpark

Voor de firmawagens wordt er gebruikgemaakt van een tankkaart. Er is een schatting gemaakt van de hoeveelheid kilometers die met firmawagens gereden wordt van en naar dit project. Op basis van die schatting is de emissie $CO_2$ berekend.

In werkelijkheid kan niet eenduidig bepaald worden welke kilometers door wie voor het project zijn afgelegd, omdat er ook veelvuldig sprake is van combinatiebezoeken, bv aan andere projectlocaties. Hierdoor is de emissielast van het wagenpark projectoverstijgend. Deze emissie is meegenomen in de totale bedrijfsfootprint, waar op basis van de tankkaartgegevens wel een exact verbruik bepaald kan worden

### 2.10.3. Elektriciteit projecten

De elektriciteit op dit project is opgewekt door middel van
- diesel aangedreven stroomgroep

Het verbruik is steeds bepaald op basis van de aankoopfacturen, hierdoor zit er weinig onzekerheid op.

## 2.11. Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

De factoren die het energieverbuik op het project beïnvloeden zijn:
- werfkeet
- stroomgroep voor pomp van verneveling

## 2.12. Emissiefactoren

Om de emissie vast te stellen, worden door diverse organisaties verschillende instrumenten en conversiefactoren verstrekt. In het kader van eenduidigheid is het belangrijk dat wordt gewerkt met

één lijst van emissiefactoren. SARPI Remediation NV heeft de emissiefactoren gebruikt waarnaar wordt verwezen in het “Handboek $CO_2$- prestatieladder 3.1”.
(www.co2emissiefactoren.be/factoren)

# 3. Reductie

Het vertragen van de opwarming van de aarde is een doel waar iedereen aan moet bijdragen, zowel bedrijven als particulieren. Een van de middelen om dat doel te bereiken is het realiseren van een reductie van de $CO_2$-uitstoot. Voor het realiseren van reductie moet worden gekeken naar historische gegevens, verwachte uitstoot op het komende project en op te nemen maatregelen.

## 3.1. Trends in eerdere projecten

In het verleden zijn er nog weinig projecten geweest die vanwege $CO_2$-gunningsvoordeel op deze manier zijn gemonitord. Hierdoor zijn er momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar om een trend op te baseren.

## 3.2. Verwachte $CO_2$-uitstoot

Dit is een project met gunningsvoordeel dat door SARPI Remediation uitgevoerd wordt.  Er werd op voorhand geen verwachte $CO_2$-uitstoot berekend.

## 3.3. Reductiedoelstellingen

SARPI Remediation heeft een algemene reductiedoelstelling voor de $CO_2$-emissie met 10% t.o.v. uitstoot van 2023, over een periode van 4. In het meest ideale geval zouden bedrijfsdoelstellingen worden vertaald naar projectgebonden doelstellingen.

Voor dit project werden de volgende reductiedoelstellingen vastgelegd: s
- troomgroep uitsluitend laten functioneren tijdens het sproeien van de ontgraven grond tegen stofverspreiding.

Door de gegevens van verschillende projecten met elkaar te vergelijken en deze te relateren aan verbruiksgegevens, zou op termijn een gefundeerde uitspraak kunnen worden gemaakt over welke maatregelen, acties en gedragingen tot een grotere kans op het behalen van de doelstellingen leiden.

## 3.4. Plan van Aanpak - maatregelen

Voor dit project is een apart plan van aanpak opgemaakt.

# 4. $CO_2$-footprint project

Om te bepalen wat de $CO_2$-footprint van het project is, zijn er een aantal gegevens bijgehouden gedurende het project.

## 4.1 Emissie-inventaris

De emissie-inventaris is opgenomen in onderstaande tabel:

| Berekende $CO_2$ - emissies | | Eenheid | Aantal | Conversie - factor * | $CO_2$ | | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP24.057 | | *E* | | *kg $CO_2$/E* | *ton* | *%* | |
| **Scope 1 : directe emissies** | | | | | | | |
| | Diesel - machines B0 | liter | 250 | 3.468 | 0.9 | 35.7 | |
| | Diesel HVO100 | liter | | 0.347 | 0.0 | 0.0 | |
| | Benzine E10 | liter | 524 | 2.821 | 1.5 | 60.8 | |
| | Diesel B7 | liter | 27 | 3.256 | 0.1 | 3.5 | |
| ***Subtotaal scope 1*** | | | | | ***2.4*** | ***100.0*** | |
| | | | | | | | |
| **Scope 2 : indirecte emissies** | | | | | | | |
| | Elektriciteit - groen NB° | kWh | | 0.167 | 0.0 | 0.0 | |
| | Electriciteit - grijs | kWh | | 0.167 | 0.0 | 0.0 | |
| ***Subtotaal scope 2*** | | | | | ***0.0*** | ***0.0*** | |
| | | | | | | | |
| **TOTAAL** | | | | | **2.4** | **100.0** | |

* Lijst emissiefactoren | CO2 emissiefactoren

° Groene stroom, niet van Belgische oorsprong. Wordt als "grijs" verrekend.

## 4.2 Verwachting versus werkelijk

Aangezien het hier een relatief klein verbruik betreft, zijn er weinig mogelijkheden om hierop in te grijpen.

## 4.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen

Er werden geen afwijkingen vastgesteld.

# 5. Transparantie

## 5.1 Communicatie Project

Het project Ovam St Pieters Leeuw is intern gecommuniceerd op het project committee.

## 5.2 Website

De publicatie van het Projectportfolio, inclusief de $CO_2$-footprint, zal gebeuren op de website van SARPI Remediation.
